2311

EPS. EMAPICA S.A.
SUB GERENCIA TÉCNICA
02 AGO 2018
HORA: 4:10
FIRMA:

Ica, 02 de Agosto 2018

INFORME Nº 306-2018-AMyE-SGT- GO-EPS EMAPICA S.A.

SEÑOR : ING. MIGUEL NIEVES ARPEZ ACEVEDO
Sub Gerente Técnico

ASUNTO : SOLICITO SERVICIO DE REBOBINADO DE (02) MOTORES ELECTRICOS PARA EQUIPO DE BOMBEO DE SOLIDOS CAMARA LIMON. **MUY URGENTE**

Me dirijo a Usted, para informarle que luego de realizar las acciones correspondientes técnicas para la puesta a punto del motor electrico marca DELCROSA, de 18HP, Trifasico, 380 voltios, 60 Hz, correspondiente a la bomba N° 01 de la citada cámara; se observa por la naturaleza del deterioro del cobre del DEVANADO en la sección contigua a la caja de conexiones, se requiere para mejor parecer que se realice por un tercero especialista el REBOBINADO del mismo (adjuto fotos referenciales). De la misma manera solicito de forma paralela que el motor "mellizo" que se encuentra en el Almacén Ctral de la empresa también sea reparado en cuanto a lo mismo a efectos de mantener un stock adecuado para relazar trabajos de Mantenimiento Preventivo como se viene realizando en otras cámaras de rebombeo de desagües.

Debo señalar también que con respecto al primer equipo de bombeo, ya se le ha realizado el Mantenimiento de la Voluta por el personal del Área de Mantenimiento. .Nota: Sugiero que para ambos casos se cambien también los rodamientos del eje rotorico, para preservar la garantía idónea de los motores eléctricos de 18 HP.

Adjunto Panel Fotográfico (03) folios. Se adjunrata el pedido N° 1801779.

DATOS DE MOTOR : Electrico eje sólido, 18HP,marca DELCROSA , Trifasico, 380voltios, modelo : 133763M1, SERIE NV160M4.

Es lo que informo a Usted, para conocimiento y demás fines a seguir.

Atentamente,

EPS EMAPICA S.A. JEFE DE AREA MANTENIMIENTO

Ing. Jaime Luján Quijandria
Jefe del Área de Mantenimiento y Emergencias de la EPS

C.c : - G. O , SGT, Archivo.

emapica
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A.

DATOS DE PLACA MOTORES ELECTRICOS.

PROCESO REPARACION MOTORES CAMARA LIMON.

N° 01

Motor electrico eje solido trifásico marca Delcrosa N° 01, Voltaje: 380 V, tipo: NV 160M4, Serie: 133763M1, R.P.M: 1745, Potencia: 18HP (13.4kw) , Hz: 60, 1800 m.s.n.m

N° 02

Motor electrico eje solido trifásico marca Delcrosa N° 01, Voltaje: 380 V, tipo: NV 160M4, Serie: 133763M2, R.P.M: 1745, Potencia: 18HP (13.4kw) , Hz: 60, 1800 m.s.n.m

Ing. Jaime lujan Quijandria

Area de Mantenimiento

DETERIORO DEL DEVANADO CONTIGUO A LA CAJA D CONEXIONES

DEVANADO (OTRA VISTA) SECTOR DETERIORADO

EPS EMAPICA S.A
JEFE DE AREA MANT

SECCION DETERIORADA CONTIGUA A LA CAJA DE CONEXIONES

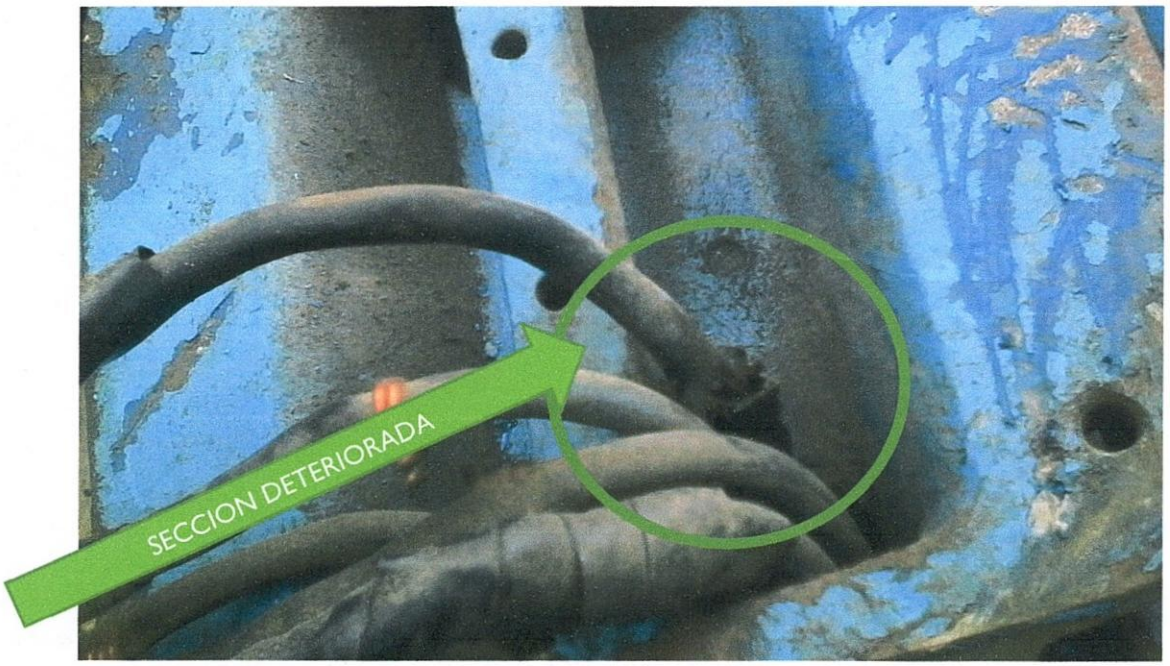

DEVANADO Y SUS CABLES DE CONEXIONES .

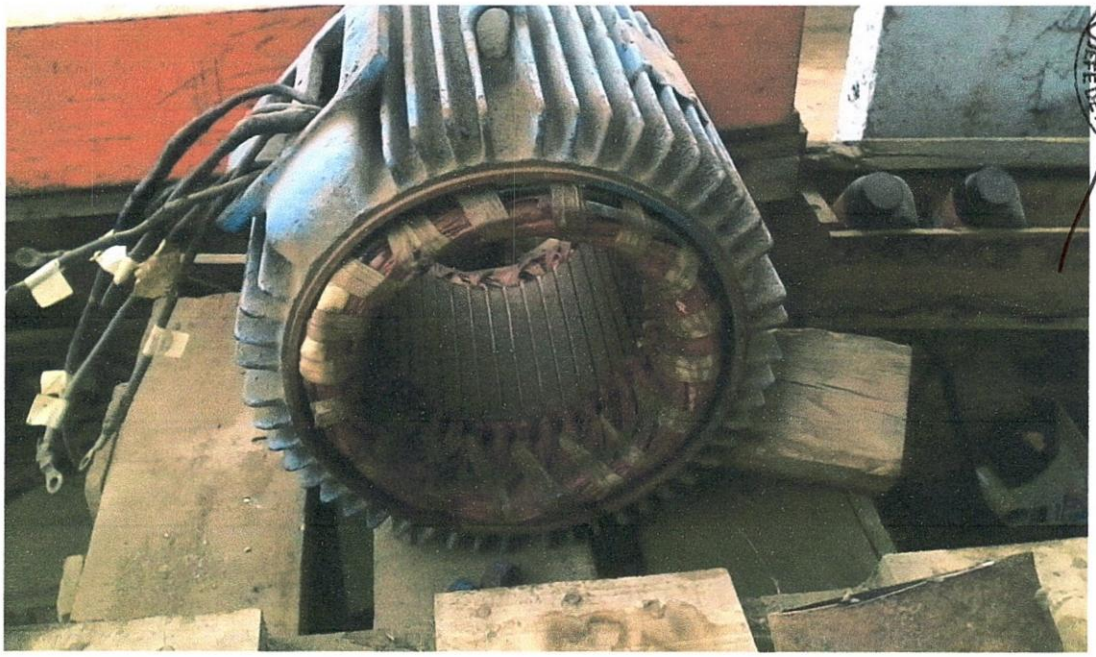

ERS EMAPICA S.A
JEFE DE AREA MANTENIMIENTO

PLACA DE MOTOR ELECTRICO DE LA CAMARA LIMON.

CARCAZA Y DEVANADO DEL MOTOR ELECTRICO

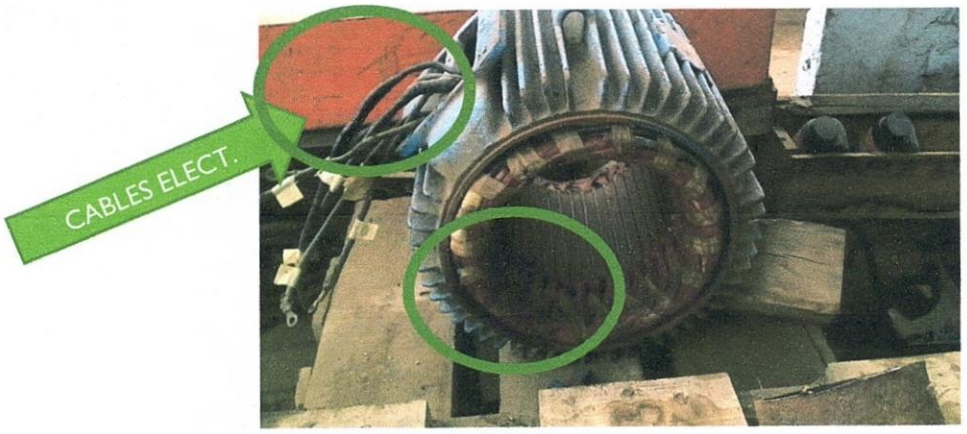

EPS EMAPICA S.A
JEFE DE AREA MANTENIMIENTO
